


SGエンジェルの始業前点検

必ず安全確認をしてからご使用ください。

許容荷重 **120kgf/m²**を厳守し、積載物を載せる場合は分散して載せてください。

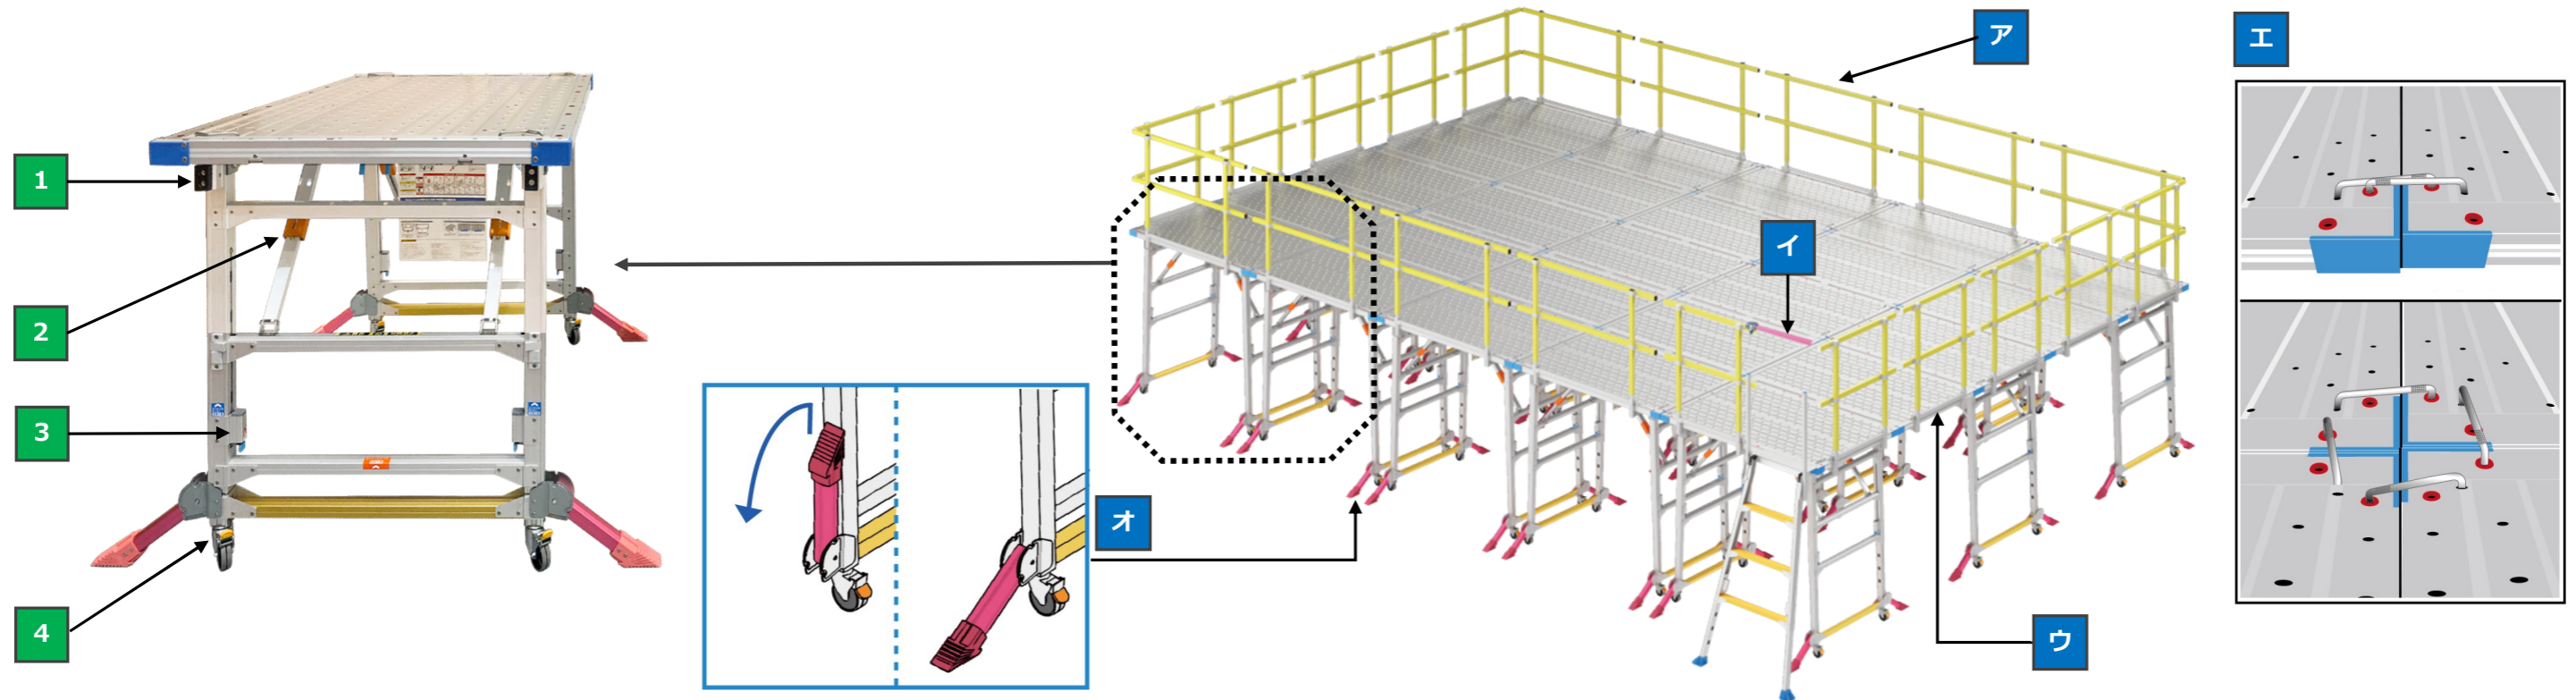

		年	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
本体 ロック確認	1	主脚の開閉ストッパーが 確実にロックされているか	4箇所	のぞく 🔍																																
	2	スライドロックが 確実にロックされているか	4箇所	目視 👁																																
	3	伸縮脚が 確実にロックされているか	4箇所	目視 👁																																
	4	キャスターフットブレーキが 確実にロックされているか(外周部)	4箇所	目視 👁																																
エンジェル ステージ 連結確認	ア	感知フレームが 外周に確実に設置されているか		目視 👁																																
	イ	回転式補助感知フレームが 昇降口に確実に設置されているか		目視 👁																																
	ウ	エンジェルブリッジが 確実に設置されているか		目視 👁																																
	エ	本体妻側同士の連結ピンが交互に 確実に差し込まれているか		目視 👁																																
	オ	エンジェルウイングが 確実に設置されているか		目視 👁																																
異常の確認	A	部材に曲がり・亀裂はないか		目視 👁																																
	B	キャスターフットブレーキの 動作に異常はないか		動作 🖐																																
	C	キャスターの旋回・回転に 異常はないか		動作 🖐																																
	D	キャスターの浮きがないか		動作 🖐																																

会社名		責任者	
-----	--	-----	--
