


SGペガ500 連結・ギャラクシーシステムの始業前点検


許容荷重 SGペガ500本体1台あたり150kg を厳守し、
積載物を載せる場合は分散して載せてください。

施工場所

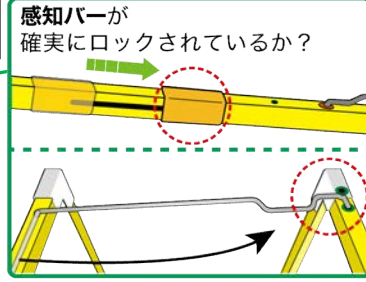
必ず安全確認をしてからご使用ください。

1 手掛かり棒が
確実にロック
されているか？

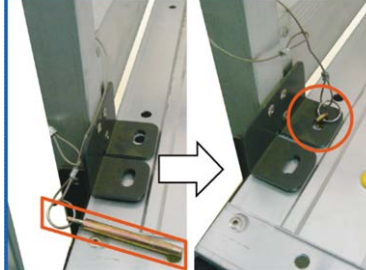

2 開き止めストッパーが
掛かっているか？


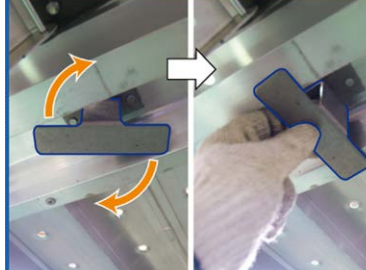
3 伸縮脚ロックレバーが
確実にロックされているか？


A

5 感知バーが
確実にロックされているか？


4 主脚の開閉ストッパーが
確実にロック
されているか？


ア 

イ 

ウ 

B

施工場所				年 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
本体 ロック確認	1	手がかり棒が 確実にロックされているか	4箇所	 目視	 動作																															
	2	開き止めストッパーが 確実にロックされているか	4箇所	 目視	 動作																															
	3	伸縮脚ロックレバーが 確実にロックされているか	4箇所	 目視	 動作																															
	4	伸縮脚ロックレバーが 確実にロックされているか	4箇所	 目視	 動作																															
	5	感知バーが 確実にロックされているか	4箇所	 目視	 動作																															
連結確認	ア	SG補助手すりが 確実に設置されているか		 目視	 動作																															
	イ	SGブリッジが 確実に設置されているか		 目視	 動作																															
	ウ	SGキャスターが 確実に設置されているか		 目視	 動作																															
異常の確認	A	本体の各部に曲がり・亀裂はないか		目視																																
	B	オプションの各部に曲がり・亀裂はないか		目視																																
その他		「足場の組立て等特別教育」を 受講しているか	—																																	

会社名

責任者
