SGペガ500 連結・ギャラクシーシステムの始業前点検

許容荷重　**SGペガ500本体1台あたり150kg** を厳守し、
積載物を載せる場合は分散して載せてください。

施工場所	

必ず安全確認をしてからご使用ください。

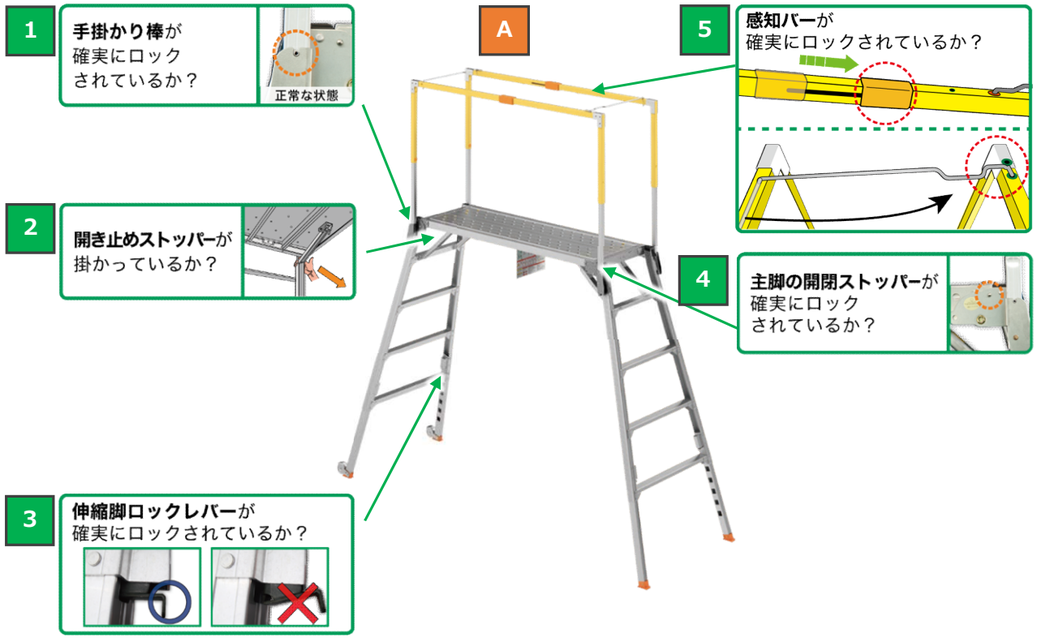

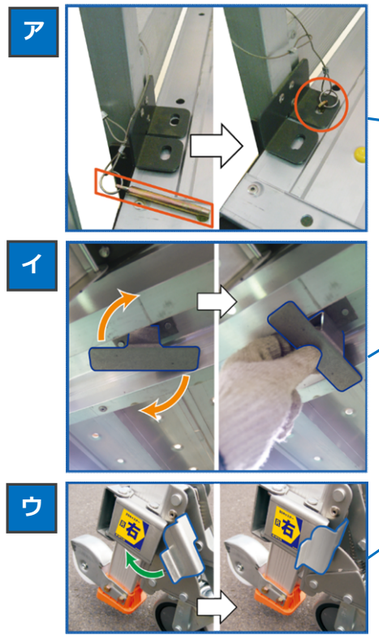

施工場所				年　月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
本体 ロック確認	1	**手がかり棒**が 確実にロックされているか	4箇所	目視　動作																															
	2	**開き止めストッパー**が 確実にロックされているか	4箇所	目視　動作																															
	3	**伸縮脚ロックレバー**が 確実にロックされているか	4箇所	目視　動作																															
	4	**伸縮脚ロックレバー**が 確実にロックされているか	4箇所	目視　動作																															
	5	**感知バー**が 確実にロックされているか	4箇所	目視　動作																															
連結確認	ア	**SG補助手すり**が 確実に設置されているか		目視　動作																															
	イ	**SGブリッジ**が 確実に設置されているか		目視　動作																															
	ウ	**SGキャスター**が 確実に設置されているか		目視　動作																															
異常の確認	A	**本体の各部**に曲がり・亀裂はないか		目視																															
	B	**オプションの各部**に曲がり・亀裂はないか		目視																															
その他		**「足場の組立て等特別教育」**を 受講しているか		—																															

会社名		責任者	

吉田泰産業株式会社
YOSHIDAYASU
